

DX戦略提案

データ・業務の分断をなくす

—「再利用・効果検証・自動化」をつなぐAIエージェント基盤の提案—

まずは過去記事384本の資産化から

2 本日本日お伝えすること

現状の課題 → 提案 → 実行計画 → 体制・効果測定の順でお話しします

1

現状分析

業務分析・SWOT・他社事例

2

提案

結論・AIエージェントの解決策・
デモ

3

実行ロードマップ

As-Is → MVP/PoC → To-Be

4

体制・KPI

推進体制と効果測定

結論

データ／システムの分断をなくし、 価値が循環する環境を作る

データ／システムが分断しているため、業務が分断し、
作業が複雑化／属人化が発生している

4 業務分析 - データ/業務の分断

データが分断しているため、企画・分析・後工程が孤立し、事業価値（CX/EX）の毀損として現れている

※CX＝顧客体験、EX＝従業員体験 / 経営目標から現場の課題までのつながりを「バリューチェーン」で整理

あるべき姿：過去の資産・実績データが常に次の企画・分析・改善に活かされている状態 → 現状は「3つの分断」によりそれが実現できていない（下記）



事業価値	該当する業務手順	現場の課題	分断
CX向上：企画の質・スピード向上	①企画テーマ選定	過去記事384本（テーマ21分類／業界20分類）の傾向が企画時に参照されていない	①再利用
CX向上：記事の的中率向上（事業成長）	⑥分析・振り返り → ①へ還流するはずが未接続	公開後のPV等（GA）が企画テーマ選定にフィードバックされていない	②効果検証
EX向上：編集現場のリードタイム短縮	②取材／③執筆・リライト／④外部チェック／⑤入稿	識者選定・外部チェック・入稿等の後工程が人手のまま未自動化（実在性は要ヒアリング）	③自動化（保留）

①②は「候補7：自動化・再利用・効果検証を繋ぐ仕組み」として統合採用済み。③は(a)実在性が未確認であることに加え、(b)①②の方が事業インパクトが大きいと判断したため保留とし、MVP検証後に改めて判断する

384本の資産と組織文化という強みを機会につなげられていないのが弱みであり、同業の先行動向が脅威を具体化している

Strengths（強み）

- ・ 384本の資産（テーマ21分類／業界20分類で構造化済み）
- ・ 執筆工程で既にAI活用が定着した組織文化

Weaknesses（弱み）

- ・ データ/業務の分断により企画への構造的フィードバックが欠如
- ・ 識者選定・外部チェック・入稿等の後工程が人手依存

Opportunities（機会）

- ・ ノーコードAI（Dify等）の普及／読者のAI関心の高さ
- ・ 他業界の実証成果（次スライド）

Threats（脅威）

- ・ 日本経済新聞社「NIKKEI KAI」が外販段階まで到達、朝日新聞社も全社Copilot導入
- ・ 同業のデータドリブン化は具体的な業界動向として顕在化

7 他社事例に見る市場動向


AIエージェント活用は業界を問わず成果を出しており、同業の新聞社2社は既に自社データの活用に着手している

企業・事例	業界	Before → After（成果）	自社への示唆
日本経済新聞社「NIKKEI KAI」	新聞・メディア（外部法人向け）	自社記事・経済データ約2000万件をRAG化し企画書生成を自動化。2025年3月に事業化。	本提案とほぼ同じ発想の先行事例。外部展開の参考にもなる
朝日新聞社	新聞・メディア（コーポレート中心）	M365 Copilot全社導入。過去資料活用エージェントを検証（4か月で週2～20時間の工数削減）、2025年5月本格導入。	編集部門展開は「今後」で、当社の現在地に近い
シーメンス（独）	製造業（設備保全）	AIチャットボット導入でリアクティブメンテナンス時間を平均25%削減。	「人を探す」→「AIが人を適切な対応へ導く」への発想転換
Samsung SDS（韓）	コーポレート業務（経費精算）	ルールベース＋生成AIで紙レシート処理時間を80%以上削減。	自動化パートへの段階的拡張の設計参考になる
Walmart（米）	小売・調達	AIエージェントによる交渉で合意率68%、支払い条件を平均35日延長。	識者選定・調整業務への応用余地を示唆
Klarna（スウェーデン）※留意点	フィンテック・カスタマーサポート	230万件対応を達成する一方、2025年に品質低下が判明し人間サポートを再導入。	過度な自動化は禁物。段階的ロードマップの根拠

出典：各社公式発表・プレスリリース等の一次情報を確認済み（詳細は添付「他社事例(参考リンク付き)」シート参照） / ※RAG化＝AIが自社データを検索・参照しながら回答を生成できるようにする技術

クロスSWOT分析（なぜ今か）

強みを機会につなぎ弱みを解消することが、脅威への先回りになる

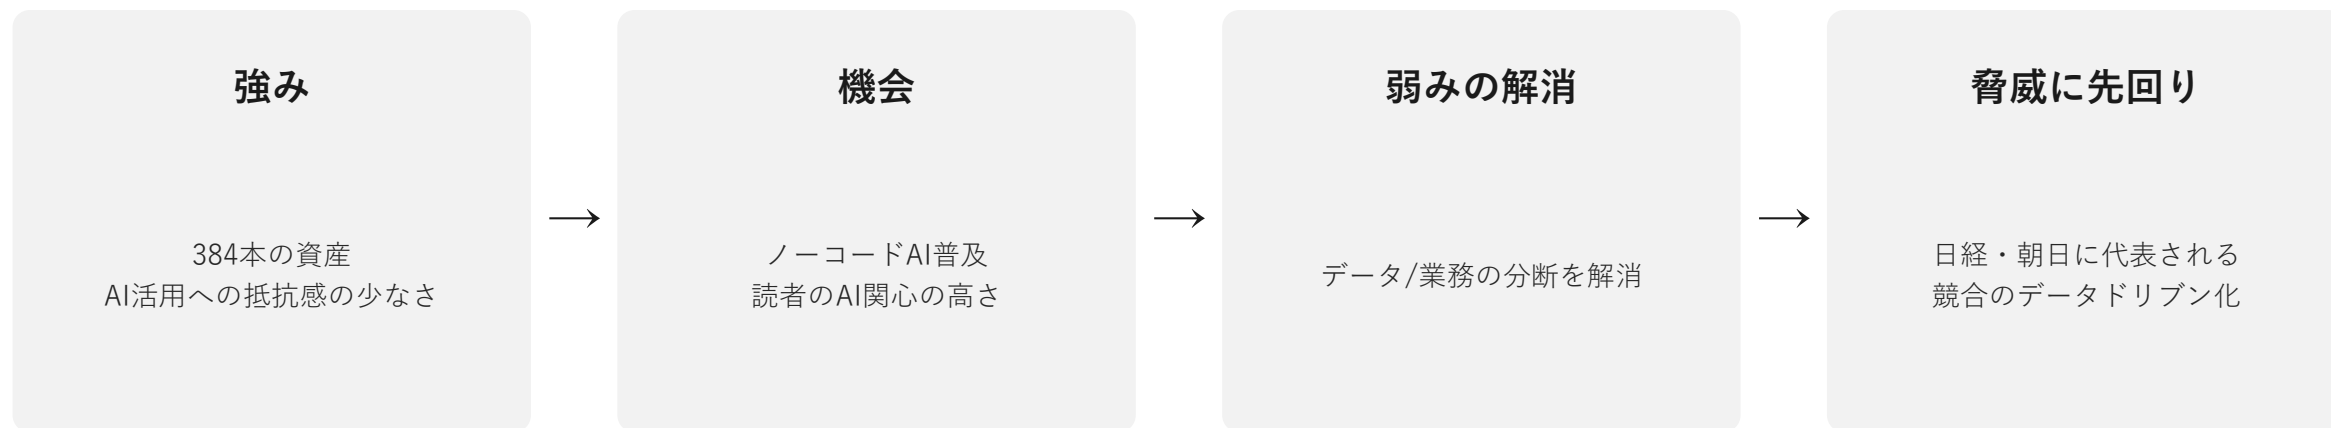

384本の資産 × ノーコードAI普及 の機会を接続 → データ/業務の分断（弱み）を解消 → 競合のデータドリブン化に先回りする、という一連の論理

独自性：多くのDX提案が③自動化から着手する中、データが循環しない根本原因＝①②の分断を先に解消する点にある

9 目指す姿・DXビジョン

再利用・効果検証・自動化をつなぐ一気通貫の仕組みで、"書く"側から"活かす"側までAIが支援する体制を目指す（第一弾は再利用＝テーマ提案AIエージェント）

※SMART目標＝目標設定の型。5つの観点の頭文字をつなげたもの

S

Specific | 具体的に

次期企画テーマ候補を自動提案するAIエージェントを構築（分断解消の第一弾＝再利用）

M

Measurable | 測定可能

情報整理時間・採用率で測定

A

Achievable | 達成可能

既存のノーコード実装の延長で対応可能。ChatGPTは既に利用可能、Difyも無料プランでMVP検証が可能のため追加コストはほぼ発生しない

R

Relevant | 妥当な範囲

自社の企画フローという小さく閉じた範囲から開始

T

Time-bound | 期限を区切る

季節性等のバイアスも考慮し、Pocアプリを3か月実証。週次でKPIを確認。

検討した6つの候補案と、今回のスコープ判断



※候補1～7＝事前の課題整理で洗い出した7つの解決アプローチ案（番号は検討順で優先順位ではない）

候補	内容	実現容易性	想定インパクト	今回のスコープ	理由
候補⑥：全体指針	再利用×効果検証×自動化をつなぐ全体構想	高	大	○ 全体方針(採用)	①②を包含し、7候補の中で業務インパクトが最大
候補②：再利用	過去記事384本からテーマ候補を自動提案するAI	高	大	○ MVP採用	データが既にあり検証可能。CXへのインパクトも大
候補①：効果検証	PV等の実績データを企画テーマ選定に還元する仕組み	低	中	× 次フェーズ	PVデータが未整備のため、整備後に次フェーズで着手
候補③：自動化	取材・外部チェック・入稿等の後工程を自動化	低	中	△ 保留	①②の方がインパクト大と判断（想定QA Q6）
候補④：補助機能	テーマ提案時の重複記事を自動チェック	中	小	△ 補助活用	候補2の再利用フローに組み込む補助機能として活用
候補⑤：分析系	記事のトレンド推移や担当者の工数を分析するレポート	中	小	× 後回し	優先度が①～④より低いため、今回は後回し

10 解決策：再利用フェーズのAIエージェントMVP

過去記事とPVデータを「一か所集中(スプレッドシート)」に集約し、Difyのテーマ提案AIエージェントに繋げる

① 再利用フェーズ

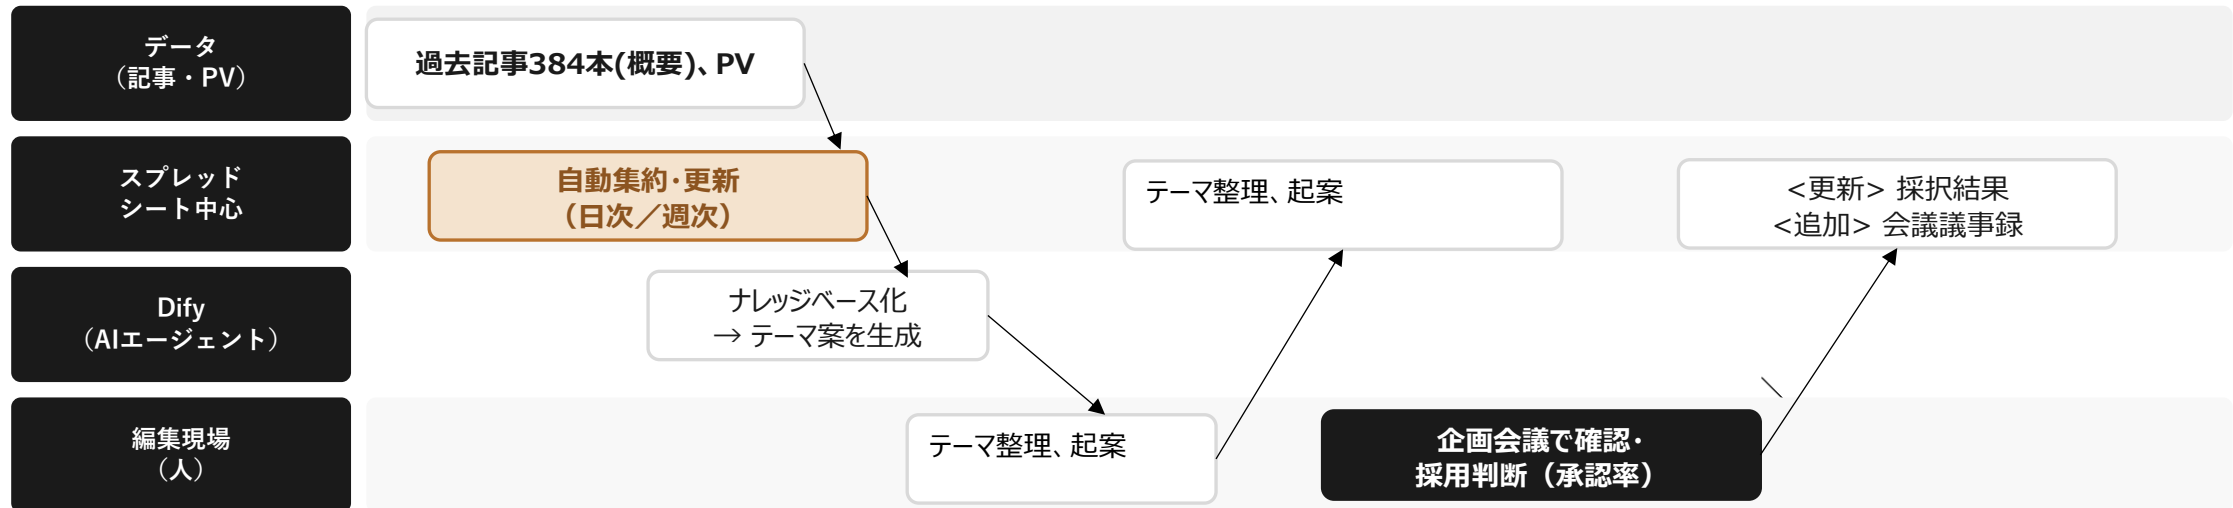

※ AIはテーマの「提案」までを担当し、最終的な採用判断は必ず人（編集現場）が行う

課題

過去記事が企画に活かされていない（＝再利用の分断）

解決策

本文・分類をDifyのナレッジベースに登録しMVPを構築

期待効果

情報整理時間を 30～60分 → 5～10分 に短縮
企画の質(PV)の向上

11 デモ：Dify実演 - 一元化をベースとした、業務支援

1シナリオとして、テーマサポートAIエージェントの活用例※動画参照

PVデータは提供がなかったので、ダミーデータ(GAデータを受領したと仮定)で実施

動画前半：一元管理したデータ(スプレッドシート)の共有
動画後半：Difyを使ったデモ

12 実行ロードマップ (As-Is → MVP/PoC → To-Be)

現状(As-Is)の分断を、MVP/PoCで実証し、To-Be（分断がつながった状態）へと段階的に引き上げる

① 実証中

As-Is（現状）

データ/業務が3つの点で分断

・①再利用 ・②効果検証 ・③自動化

企画は都度ゼロから、分析結果も活きず、後工程は人手のまま

MVP/PoC（今回の実行スコープ）

過去記事384本+PVデータをスプレッドシートに集約し、Difyのナレッジベース化・テーマ提案AIエージェントを構築（＝①再利用の分断を解消）。

情報整理時間 30～60分→5～10分 を検証。
企画の質(PVや採択率)を検証。

To-Be（目指す姿・MVP成功後）

i一元管理のデータ上でPV等の実績データ連携を深め
②効果検証の分断を解消。後工程へも段階的にAI活用を拡張し③自動化の分断解消を目指す（保留・要ヒアリング）＝スライド9のビジョンと同じ状態

13 KPI・モニタリング指標

起案数・承認率・PV数で、MVP前後の「有意な向上」を測定する

フェーズ	KPI項目	現状値	測定・目標の考え方
MVP/PoC（先行・業務効率）	企画テーマ選定の情報整理時間	30～60分	5～10分へ短縮（月次）
MVP/PoC（先行・事業価値）	起案数（AI提案テーマ数）	未計測	MVP開始前にベースライン計測→導入後と比較
MVP/PoC（先行・事業価値）	承認率（企画会議での採用率）	未計測（0%）	ベースライン計測後、導入後と比較（企画会議ごと）
習慣化指標（土台）	分析・振り返りの実施率	未実施・任意	100%・毎号実施（月次）。PV評価の前提
To-Be（成果・事業価値）	PV数（採用テーマ記事の平均PV）	データはあるが未活用	MVP採用記事 vs 比較対象記事のPVを比較

「有意な向上」の判定方法（例）

- 指標の自然な変動幅（標準偏差）を先に把握し、それを明確に超えて改善した場合を「成功」とみなす（例：PVの標準偏差が±3%程度なら、+4%以上の向上を目安とする）
- PVは一部の記事が突出する裾の長い分布になりやすいため、十分なサンプル数を確保できるか事前に確認する。少ない場合は中央値や対数変換した値での比較も検討する
- 起案数・承認率・PVはいずれもスプレッドシート上に記録できるため、追加ツールなしでモニタリングを一元管理できる

14 体制・企業文化・人材・セキュリティの論点

現場発の施策として動きやすく、セキュリティ面の懸念も小さい一方、経営層の関与や体制面は今後の確認事項である

推進体制

わかっていること

編集現場発の個別施策として検討中

要確認・未着手のこと

CDO設置・経営陣の関与など5項目はいずれも「未着手／要確認」

企業文化

わかっていること

生成AIが日常的に使われ、新ツールへの抵抗感は比較的低いと推測。スプレッドシート＋Difyという馴染みのある構成のため抵抗感はさらに小さいと考えられる

要確認・未着手のこと

現場確認は未実施（一般的な想定の域を出ない）

人材・マインド

わかっていること

「変化への適応」「反復的アプローチ」は現状レベルを把握済み

要確認・未着手のこと

「コラボレーション」「事実に基づく判断」等は情報不足

データ・セキュリティ

わかっていること

ChatGPTの社内利用実績が既により、記事内容は個人情報を含まない公開情報であるため、セキュリティ・権利上の懸念は小さいと判断

備考

数少ない解消済みの論点

15 まとめ

データ／システムの分断をなくし、価値が循環する環境を、まず小さく始めて作る

結論の再提示：①再利用 → ②効果検証 → ③自動化の順に、分断を解消していく

Next Action：承認・ご判断いただきたいこと



承認にあたって：コスト・期間・リスク／撤退ライン

コスト

追加コストはほぼ発生しない（ChatGPT契約範囲内／Dify無料プランで検証可能）

期間

研修期間内のMVP完成が目標（具体的期日は今後確定・要調整）


**リスク／
撤退ライン**

KPIが一定期間で有意に向上しなければ一旦停止し他候補を再検討。順調なら次フェーズへ拡大

※ 経営層への共有は必須のNext Actionではなく、必要と判断された場合の任意の追加ステップとして扱う

15 APPDEIX:展望

データが一元管理された状態であれば、APIやDifyを活用することで、自動化/業務品質向上は実現可能です
起案の部分も、必要であれば、Difyから完全自動化してもかまいません。

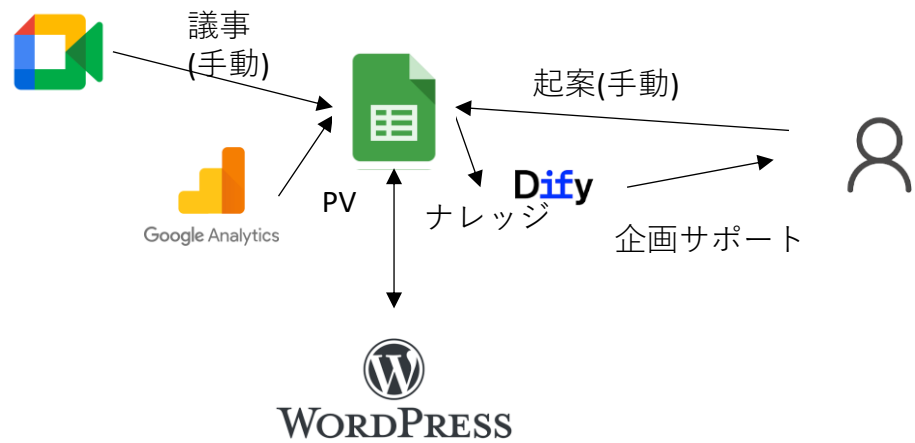

課題	アプローチ	実現可能性	期待効果/ROI
PV情報の自動取得	スプレッドシートとGAは親和性があり	自動更新は可能	- (手動更新でも差し支えない)
記事投稿の際、入力ミスや修正の負荷が高い	スプレッドシートからGAS経由で検証環境のwordpressを更新する	GAS経由でwordpress更新は可能	要ヒアリング
会議体議事の自動抽出/格納	Google driveにDifyがアクセス→録画データから文字起こし→スプレッドシートに記入	可能	- (手動更新でも差し支えない)
記事の修正に時間がかかる/安定しない	MVP開発のDifyを利用し、高PVの記事を選定し、その記事をAIにインプットし、添削させる。	可能	要ヒアリング
記事の修正に時間がかかる/安定しない	レビューログをスプレッドシートに記入し、Difyを介して添削する	可能	要ヒアリング
